Energetische Sanierung Landesleistungszentrum Radsportforum Büttgen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Abgabe LPH 3	1 Tag	Fr 06.06.25	Fr 06.06.25	
2	Förderantrag RhRev + NRW	7 Wochen	Do 15.05.25	Mi 02.07.25	
3	Laufzeit Förderanträge ?	10 Monate	Do 03.07.25	Mi 08.04.26	2
4	Förderbescheid ?	1 Tag	Do 09.04.26	Do 09.04.26	3
5	Neuausschreibung ab LPH 4	41 Wochen	Di 10.03.26	Mo 21.12.26	
6	Vorlauf und Einarbeitung neuer Generalplaner	10 Wochen	Mo 04.01.27	Fr 12.03.27	5
7	LPH 4	6 Wochen	Mo 15.03.27	Fr 23.04.27	6
8	LPH 5	10 Monate	Mo 26.04.27	Do 10.02.28	7
9	LPH 6/7 _ größerer Versatz LPH5/LPH 6 bei neuem GP anzunehmen	6 Monate	Mo 13.09.27	Do 09.03.28	8AA+5 Monate
10	LPH 6/7 - 2. Etappe	6 Monate	Fr 10.03.28	Do 24.08.28	9
11	Bauzeit Gesamtprojekt	511 Tage	Fr 10.03.28	Fr 08.03.30	9
12	Wintersaison	126 Tage?	Fr 17.10.25	So 12.04.26	
13	Politische Beschlüsse	1 Monat	Fr 10.04.26	Do 07.05.26	4
14	Vorlauf	1 Monat	Fr 08.05.26	Do 04.06.26	13
15	LPH 4 L/S	6 Wochen	Fr 05.06.26	Do 16.07.26	14
16	LPH 5 L/S	10 Monate	Fr 17.07.26	Di 04.05.27	15
17	Vorlauf L/S	6 Wochen	Di 15.12.26	Do 04.02.27	21
18	LPH 6/7 - EU-weite Ausschr.!	6 Monate	Fr 05.02.27	Do 22.07.27	16AA+3 Monate;17
19	LPH 6/7 - 2. Etappe	6 Monate	Fr 23.07.27	Mi 19.01.28	18
20	Bauzeit Gesamtprojekt	511 Tage	Fr 23.07.27	Do 02.08.29	18
21	Neuausschreibung ab LPH 6	40 Wochen	Di 10.03.26	Mo 14.12.26	
22	Vorlauf und Einarbeitung neuer Generalplaner	10 Wochen	Mo 04.01.27	Fr 12.03.27	21
23	LPH 6/7 auf LPH 5 L/S	6 Monate	Mo 15.03.27	Fr 27.08.27	22;16AA+5 Monate
24	LPH 6/7 - 2. Etappe	6 Monate	Mo 30.08.27	Do 24.02.28	23
25	Bauzeit Gesamtprojekt	511 Tage	Mo 30.08.27	Fr 07.09.29	23
26	Wintersaison	125 Tage	Mi 07.10.26	So 11.04.27	
27	Wintersaison	131 Tage	Mo 04.10.27	Fr 14.04.28	
28	Wintersaison	131 Tage	Fr 29.09.28	Fr 13.04.29	
29	Abschluss Projekt (Fö RhRev) bis	1 Tag	Mo 31.12.29	Mo 31.12.29	

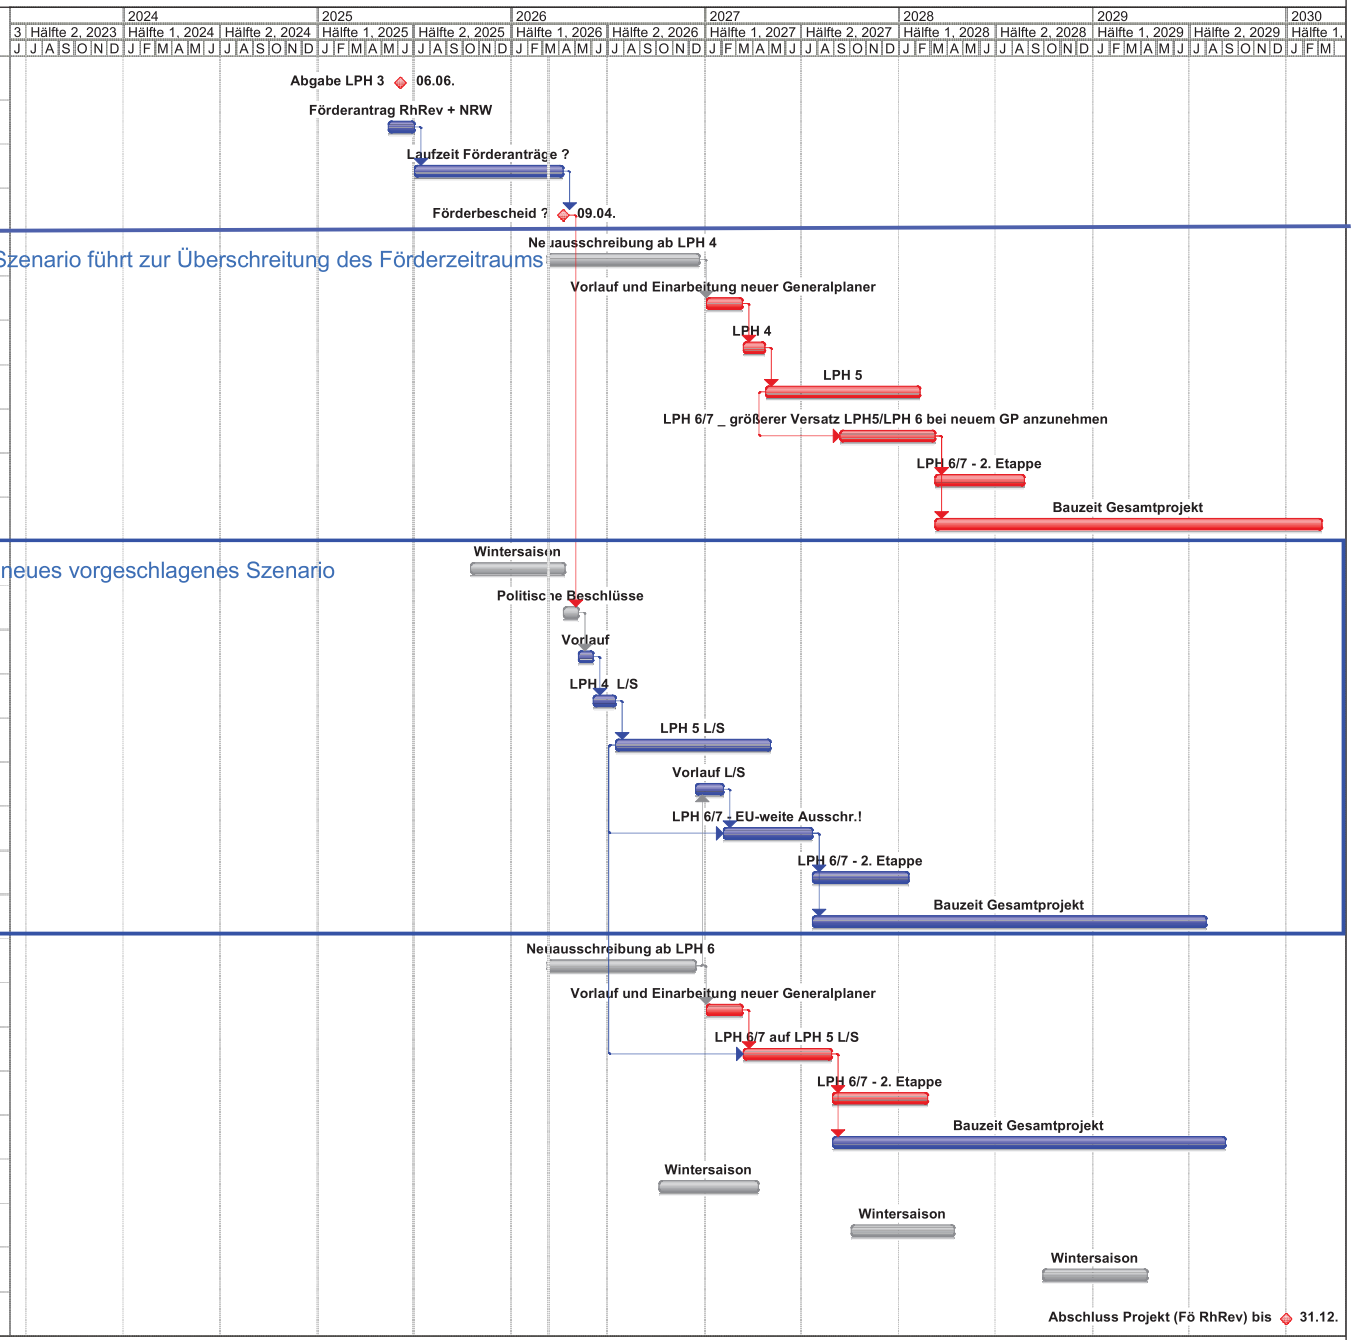

Projekt: 629_Zeitplan
Datum: Mi 11.03.26

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein
